

A close-up photograph of a water faucet with a single drop of water falling from it. The background is a soft, out-of-focus blue.

AKTIV
ATTRAKTIV



ORIENTERING OM STATUS I VANN- OG AVLØPSPROSJEKTER

PMU 01.02.2023

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



Oppstart: 2023

Ferdigstilles: 2023/24

561 Aktivitetsparken i Buvika

Geoteknisk detaljprosjektering gjenstår, dette bestilles etter vedtak 31.01.2023.

INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



Oppstart:

Vår 2023


Ferdigstilles:

2023/24

566 Buvik kirkegård

Plan for kirkegården er godkjent av prosjektets geoteknikker. Mål om å lyse ut entrepriskonkurranse ila våren 23.

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

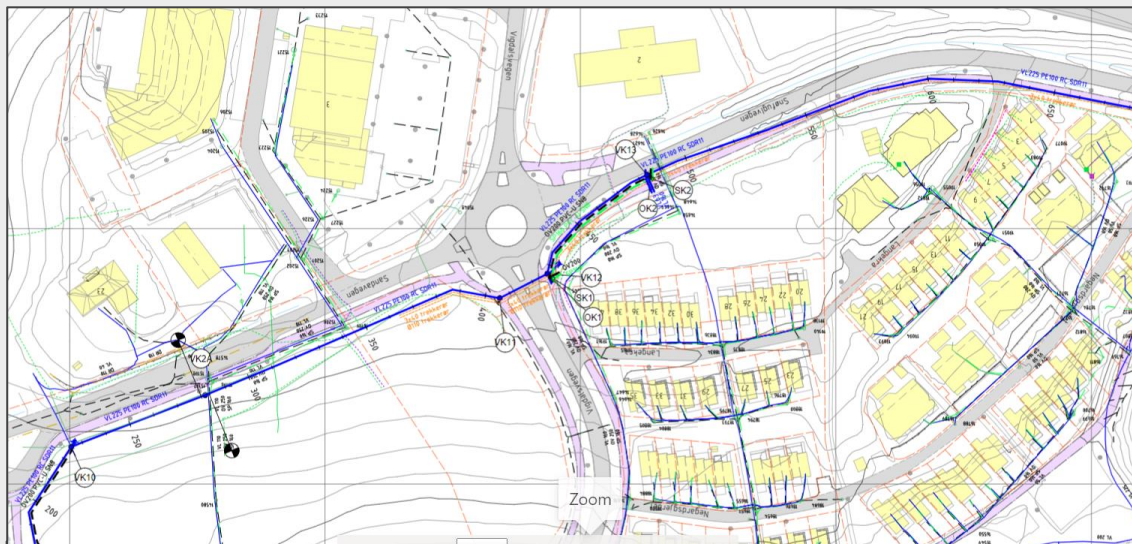


660 Ringledning Buvika

Prosjektet ble ferdigstilt i sept/okt.

Oppstart: 2022

Ferdigstilles: Ferdig

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

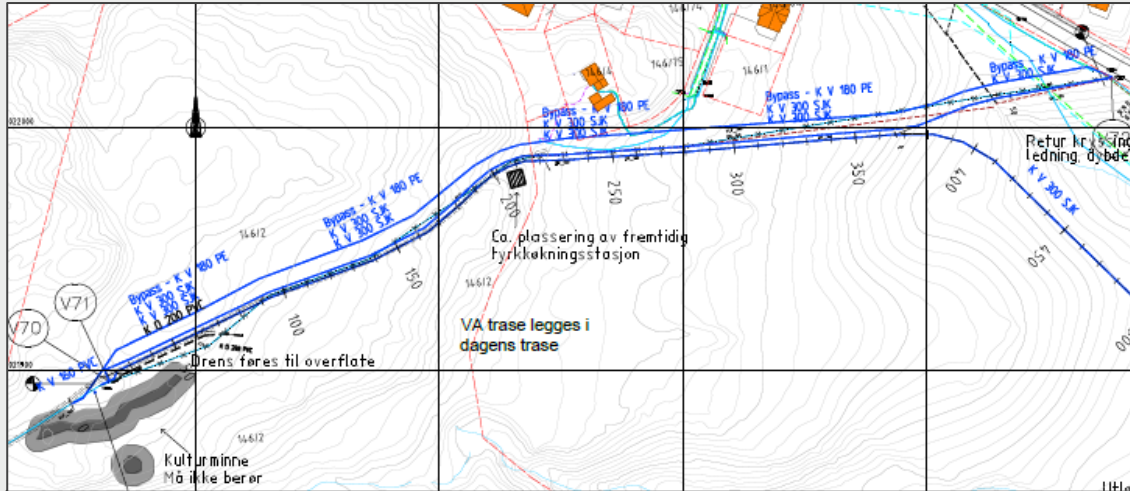

Oppstart:

Vår 2023


Ferdigstilles:

2023

662 Vassåsen høydebasseng

Prosjektering pågår, anslått byggestart i vår 2023 med ferdigstillelse 1. januar 2023.

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

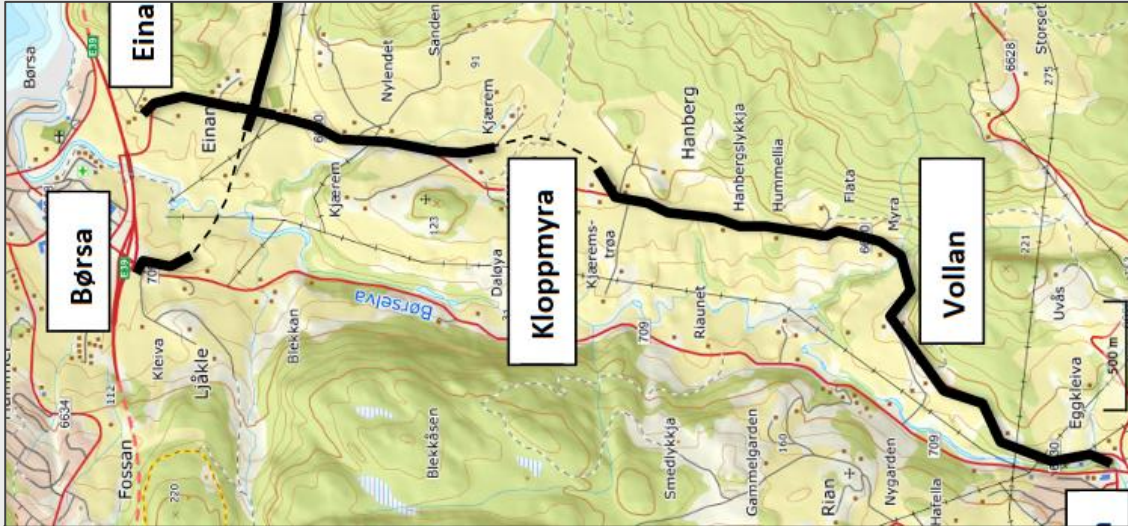

656/754 Eggkleiva - Børsa

Arbeidene pågår. Folkemøte er gjennomført, oppsummering og tiltak etter dette gjennomføres omgående.

Oppstart:

Okt 2022

Ferdigstilles:

Høst 2024

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID



658 VA Trøvegen

Arbeider i Trøvegen er ferdigstilt, arbeider i Brubakken gjenstår.


Oppstart:

Vår 2022

Ferdigstilles:

Påske 2023

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

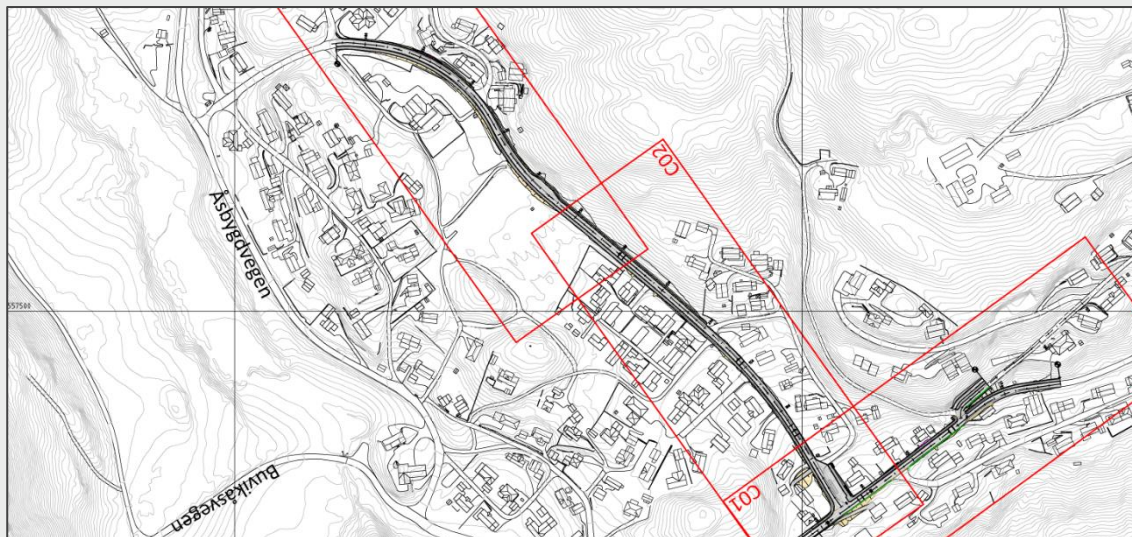

666 VA Finnmyrvegen

Veien er stengt, arbeidene pågår og vil vare ut året.


Oppstart:

Årsskifte 22/23

Ferdigstilles:

Høst 2023

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

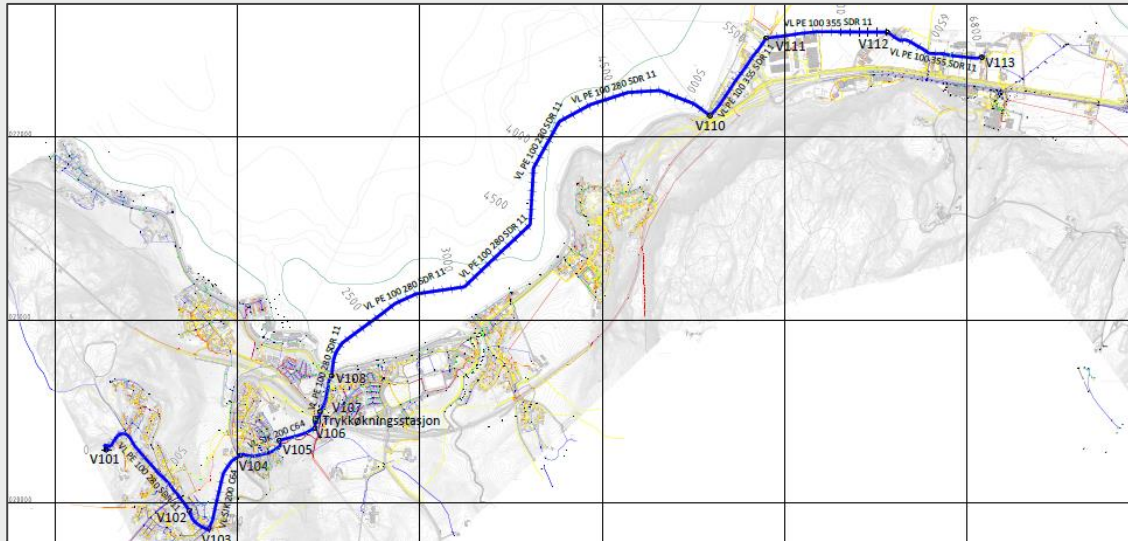

Oppstart:

Vår 2023?

Ferdigstilles:

Sommer 2024?

668 Reservevann

Arbeid med grunneieravtaler pågår, samt avtale med Trondheim kommune om MeTroVann. Første entreprise kan lyses ut når avtalene er på plass og nødvendige godkjenninger er i orden.

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID



768 VA Børsa - Eliløkken

Resultatene på de supplerende grunnundersøkelsene viste langt verre grunnforhold enn håpet. Opprinnelig trasé vil være svært kostbar, ny trasé utredes. Dette innebærer 1-2 nye grunnboringer.


Oppstart:

Vår 2023?

Ferdigstilles:

Usikker

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

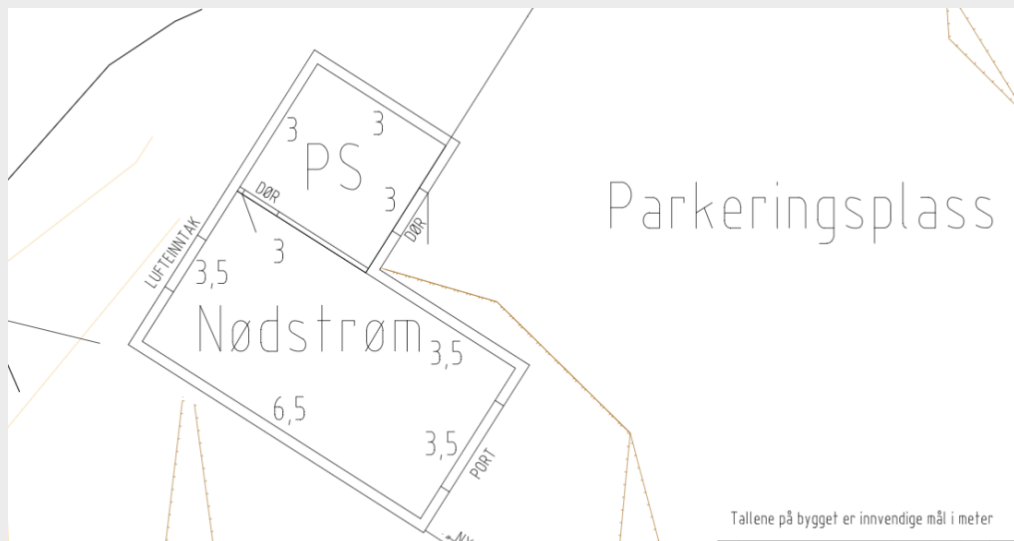

Oppstart: Høst 2021

Ferdigstilles: Usikker

770 VA Børsa sentrum

Entreprenør er kontrahert, men pumpestasjonen kan ikke settes i bestilling for trasé mot Eliløkken er avklart.

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID




Oppstart: 2023?

Ferdigstilles: 2024

729 Viggja renseanlegg

Grunnundersøkelser og noe prosjektering pågår.

VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

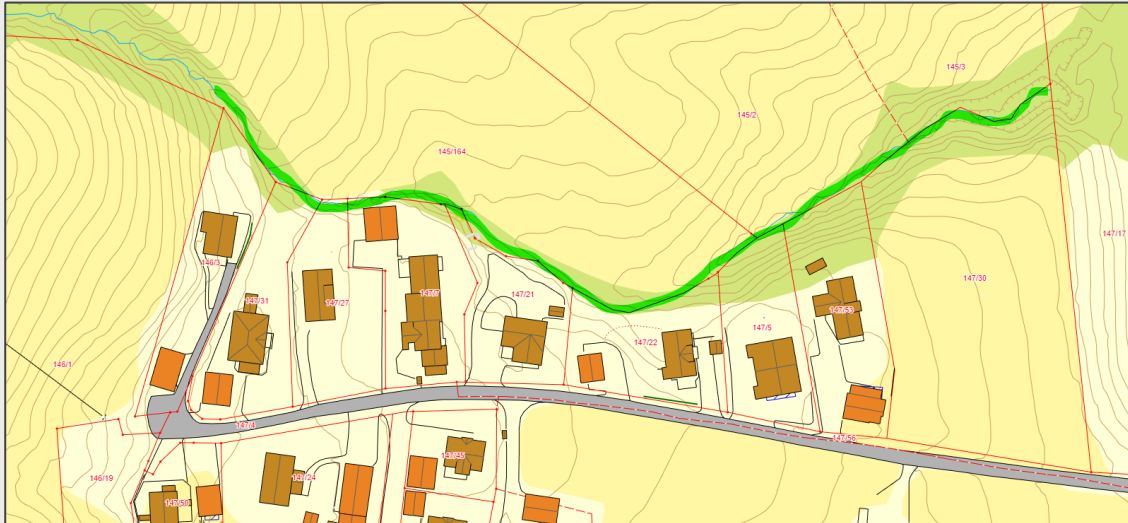

Håggåbekken

Arbeidene er påstartet, planlagt ferdigstillelse i mars.

Oppstart:

Januar 2023

Ferdigstilles:

Mars 2023

